


PLANO DE CONSTRUCTIBILIDADE


MOVIMENTAÇÃO DOS ADCHDS

Dados dos Equipamentos.


Modulo inferior:




PESO DO MÓDULO INFERIOR: 7941 Kg



Modulo superior:


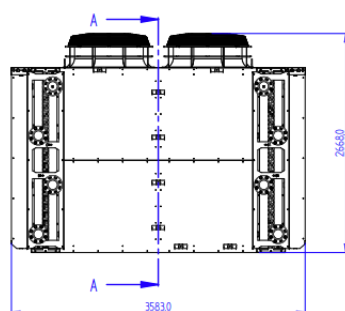


PESO DO MÓDULO SUPERIOR: 8525 Kg


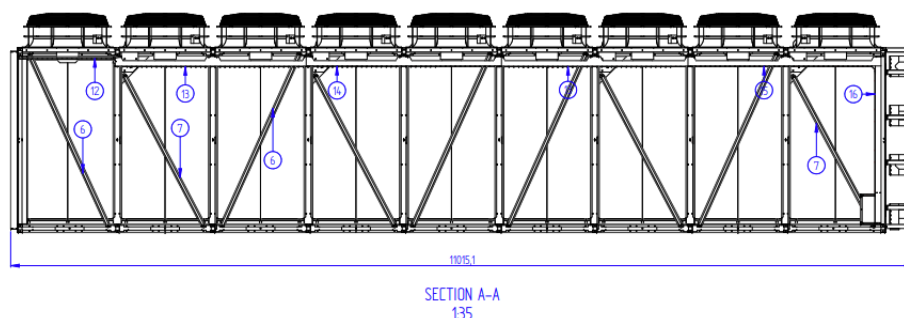


Instrução para içamento.

Modulo inferior:



Nota: É recomendado utilizar um
balancim para içamento e movimentação

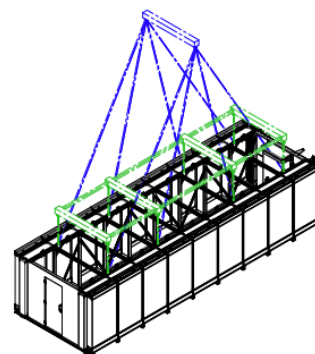
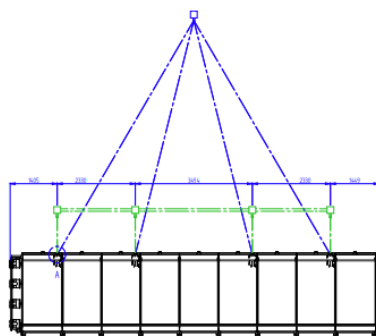


PESO DO MÓDULO INFERIOR: 7941 Kg

Código de Bar - RSE		☐ Nota crítica		Estado	Cancioneiro		200
				Processo	1847 NOTAS		
				Processo			
				Assunto	OPORTUNIDADE RSE		
				Descrição			
				Detalhamento	Ordem de Serviço ACESCH 248		
Período				Tratamento	Normal		
	Data		2008	Valor		R\$ 12.182,810	
	Data		01/05/2008	Valor		R\$ 12.182,810	
	Data		01/05/2008	Valor		R\$ 12.182,810	
	Data		01/05/2008	Valor		R\$ 12.182,810	
	Data		01/05/2008	Valor		R\$ 12.182,810	

Nota: Recomendamos a utilização de um balancim para içamento e movimentação, operando com todos os pontos de içamento.

Modulo superior:

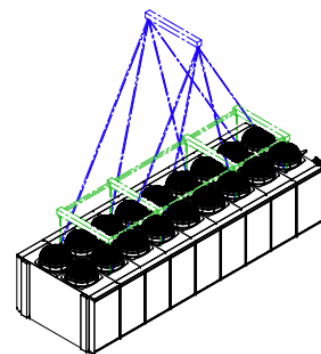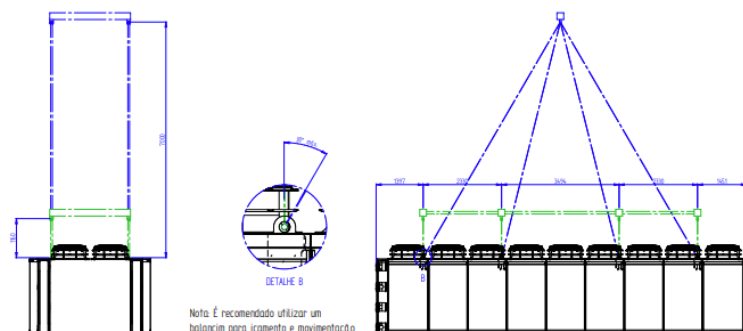

PESO DO MÓDULO SUPERIOR: 8525 Kg


Nota: Recomendamos a utilização de um balancim para içamento e movimentação, operando com todos os pontos de içamento.

Cuidados na movimentação dos Equipamentos.

- ✓ Utilizar equipamento de movimentação que atenda a capacidade de carga e elevação.
- ✓ Utilizar equipamentos que atendam as especificações.
- ✓ Seguir as orientações deste documento.
- ✓ Respeitar os pontos de içamento.
- ✓ Utilizar balancim que atenda a capacidade de carga.
- ✓ Movimentar com cuidado até o local desejado.

Passo a passo para o acoplamento e interligação dos módulos.

PASSO 1

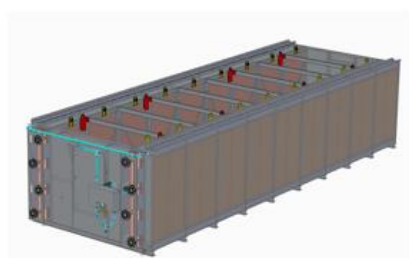

- Remover os módulos inferior e superior da embalagem de madeira.
- Utilizar olhais de içamento para movimentação dos módulos





PASSO 2




- Posicionar o módulo inferior sobre a base metálica ou civil.
- Garantir que os amortecedores de vibração estejam bem posicionados.

PASSO 3

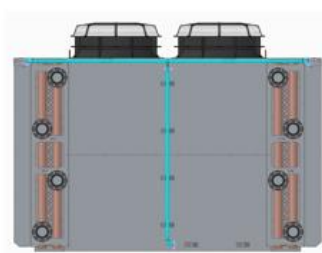


- Posicionar o módulo superior sobre o módulo inferior.
- Observar para que os módulos estejam em perfeito alinhamento.

PASSO 4

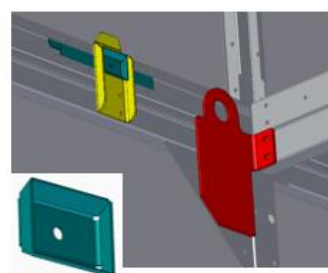

- Utilizar arruelas de ajuste e parafusos M10 para fixar o módulo superior ao inferior.

PASSO 5



- Conectar a interligação do chuveiro do módulo superior ao quadro de válvulas.

Registro do Teste de Acoplamento dos Módulos na Linha de Produção.



Disponibilização da Estrutura para Montagem dos Módulos na Planta do Cliente.

Não faz parte do escopo de fornecimento a estrutura/equipamentos de apoio para montagem hidráulica e elétrica de integração entre os dois módulos do equipamento ADCHD, módulo inferior X módulo superior:



Esta estrutura fica sob a responsabilidade do Cliente e tem que atender normas de trabalho em altura, seguem abaixo imagens ilustrativas de algumas alternativas utilizadas em obra:



Andaimes Especiais



PTAs




Linhas de Vida

Escopo de fornecimento.

Não faz parte do escopo de fornecimento a descarga em obra e nenhuma movimentação dos equipamentos posterior entrega.

Informações da Embalagem.

Módulo Inferior

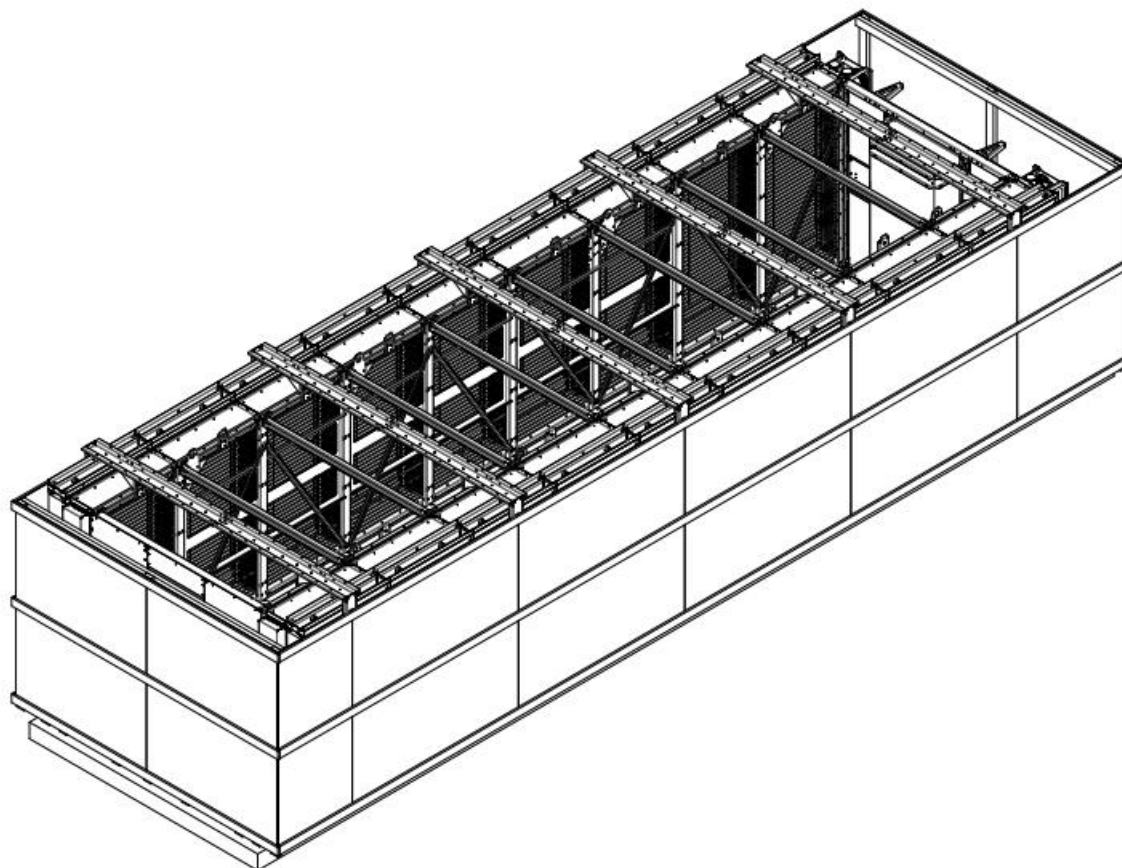


Partes da Embalagem:

- >> Estrado madeira/metálico inferior;
- >> Fechamento lateral total em MDF Naval;
- >> Travessas superiores para estruturação dos fechamentos laterais;

MÓDULO INFERIOR PESO DO EQUIPAMENTO: 7941 Kg

PESO DO EQUIPAMENTO EMBALADO: 9533 Kg

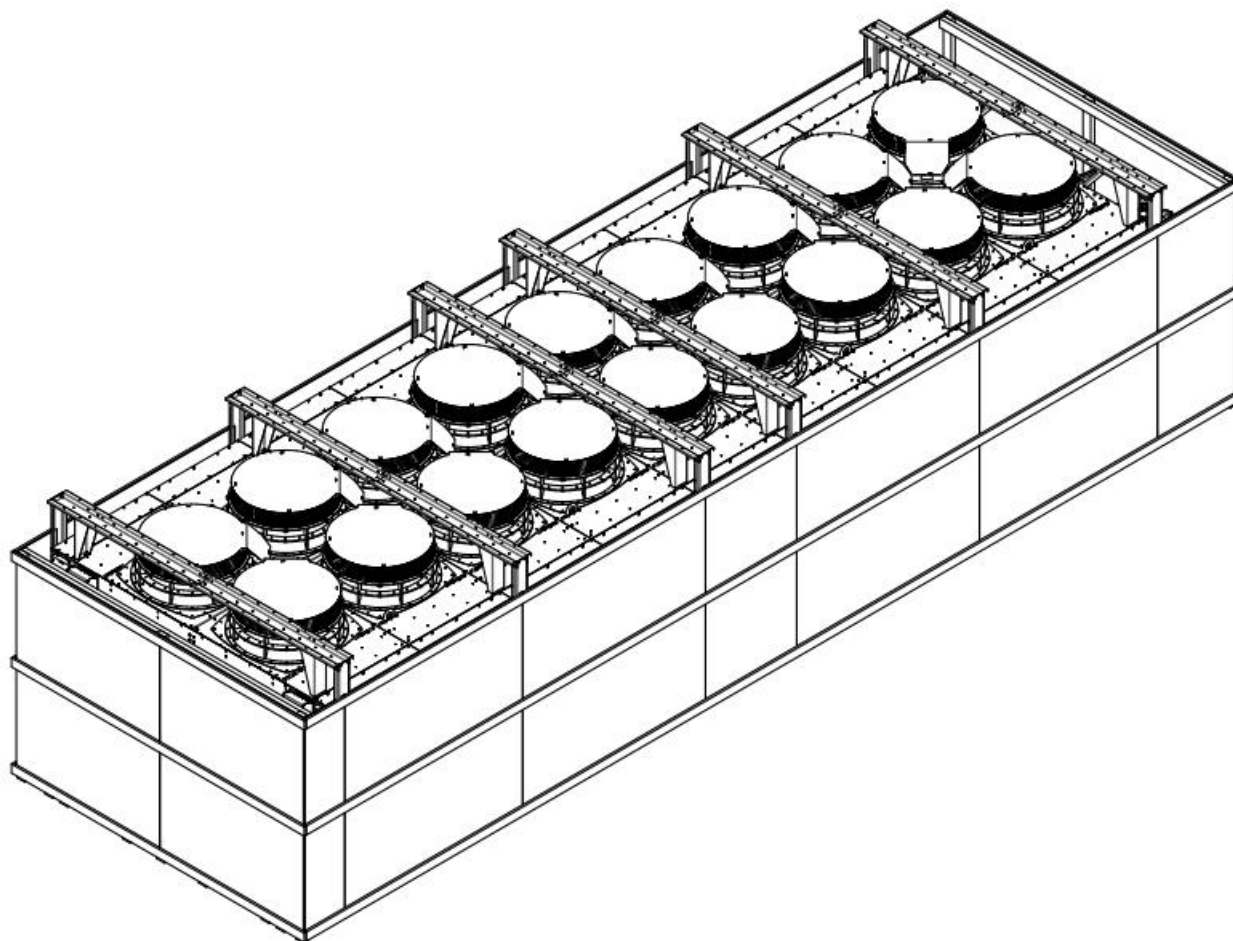

Partes da Embalagem:

- >>Estrado madeira/metálico inferior;
- >>Fechamento lateral total em MDF Naval;
- >>Travessas superiores para estruturação dos fechamentos laterais;
- >>Proteções em inox para os motores dos ventiladores;

PESO DO EQUIPAMENTO: 8525 Kg

PESO DO EQUIPAMENTO EMBALADO: 10193 Kg

Instruções para Armazenamento do Equipamento.

- Partes do Equipamento com risco de corrosão e acúmulo de sujeira;
- Proteja o Equipamento contra pó, sujeira, umidade, contaminação, maresia e outros efeitos nocivos;
- Evite armazenar o Equipamento por mais tempo do que o necessário;
- Somente armazene os Equipamentos em suas embalagens originais até a instalação;
- Armazene o Equipamento em um local protegido contra intempéries, poeira, sujeira, umidade e livre de contaminação e maresia, até o momento da instalação;
- Armazenar o Equipamento em um local coberto e protegido, evitando exposição a condições adversas como umidade excessiva ou temperaturas extremas.
- Durante períodos prolongados de armazenamento ou tempo de inatividade, os ventiladores devem ser operados por pelo menos 2 a 4 horas por mês.

Importante!

Seguir as orientações deste documento.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações consulte nossa área técnica.
